

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

“CEVIC”

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

**CARRERAS DE:** “Economía” e “Ingeniería Financiera”

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPAS: “PLANIFICACIÓN. EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN”**

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

Fortalecimiento económico y financiero de fundaciones de atención a personas con discapacidad y el desarrollo de nuevos productos y nuevos mercados.

**DOCENTE COORDINADOR:** Econ. Mg. Francisco Mosquera S.

**DOCENTE AUTOR Y PARTICIPANTE DEL PROYECTO:** Econ. Mg. Francisco Mosquera S.

**ENTIDAD BENEFICIARIA:**

Fundación Cuesta Holguín

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA:**

Ing. Pablo Cuevas Pozo

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** “FCAUD-IF-E-001-SEPTIEMBRE 2013 – FEBRERO 2014”

Ambato, Septiembre de 2013

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

**“CEVIC”**

**FACULTAD DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORÍA”**



**PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad**

**CARRERAS DE: “ECONOMÍA” e “Ingeniería Financiera”**

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPA I: “PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO”**

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

Fortalecimiento económico y financiero de fundaciones de atención a personas con discapacidad y el desarrollo de nuevos productos y nuevos mercados

**DOCENTE COORDINADOR:** Econ. Mg. Francisco Mosquera S.

**DOCENTE AUTOR DEL PROYECTO:** Econ. Mg. Francisco Mosquera S.

**ENTIDAD BENEFICIARIA:**

Fundación Cuesta Holguín

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA:**

Ing. Pablo Cuevas Pozo

**CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCAUD-IF-E-001-SEPTIEMBRE 2013 – FEBRERO 2014”**

Ambato, Septiembre de 2013

## ÍNDICE ETAPA I

CONTENIDO	Pág.
Carátula	1
Índice	2
1. Datos Generales del Proyecto.	4
1.1 Nombre del Proyecto.	
1.2 Entidad Ejecutora.	
1.3 Cobertura y Localización.	
1.4 Monto.	
1.5 Plazo de Ejecución.	
1.6 Sector y tipo de Proyecto.	
1.7 Número de Docentes Participantes.	
1.8 Número de Estudiantes Participantes	
1.9 Entidad Beneficiaria	
1.10 Número de Beneficiarios	
2. Diagnóstico y Problema	5
2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.	5
2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.	7
2.3 Línea Base del Proyecto.	9
2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).	9
3. Objetivos del Proyecto	10
3.1 Objetivo General	11
3.2 Objetivos Específicos	11
3.3 Matriz de Marco Lógico.	12
4. Estrategia de Ejecución.	17
4.1 Cronograma por Componentes y Actividades.	17
5. Presupuesto y Financiamiento.	20
5.1 Presupuesto del Proyecto	20
6. Anexos.	
6.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria	
6.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita o Convenio	

## PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

### a. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

<b>1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:</b>
Fortalecimiento económico y financiero de fundaciones de atención a personas con discapacidad y el desarrollo de nuevos productos y nuevos mercados
<b>1.2 ENTIDAD EJECUTORA:</b>
Universidad Técnica de Ambato - Facultad de Contabilidad y Auditoría – Carrera Economía, e Ingeniería Financiera.
<b>1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:</b>
Fundación Cuesta Holguín
<b>1.4 MONTO:</b>
El monto es de 1250 dólares
<b>1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>
El plazo de ejecución del proyecto es desde el mes de Septiembre a Febrero de 2014.
<b>1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:</b>
<b>Sector:</b> Áreas Genéricas y Complementarias <b>Tipo:</b> Asesoría
<b>1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:</b> 1 docente
<b>1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES:</b> 22 estudiantes
<b>1.9 ENTIDAD BENEFICIARIA:</b>
Fundación Cuesta Holguín, y fundaciones asociadas en los cantones de Tisaleo, Mocha, Huambaló, Ambato, Pelileo. Fundación Manos Unidas; Fundación San Juan Bautista; Fundación Corazón de María.
<b>1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS:</b>
160 personas, divididas entre niños y jóvenes de las fundaciones, 320 padres de familia y personal educativo de la fundación de manera indirecta.

## 2 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

### 2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

Las personas con discapacidad son personas que al no contar con sus capacidades completas en muchos de los casos son personas relegadas de las actividades. Se debe indicar en primera instancia, que el término "NORMAL", no existe, las Naciones Unidas.

Debemos entender que la **discapacidad** o "incapacidad" es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, y en igualdad de condiciones con las demás.

Tomando esto como referencia podemos entender que son personas que pueden realizar cualquier tipo de actividad, de acuerdo a sus capacidades propias.

En las entidades donde se realizará el presente proyecto, presentan como común denominador, que el desconocimiento de actividades económicas y financieras les ha llevado a perder recursos, lo que se pretende hacer con el presente proyecto es fortalecer las fundaciones para que tengan una mejor perspectiva y mejores posibilidades de captar recursos.

En la actualidad la mayoría de los trabajos se están realizando de una manera empírica casi sin asesoramiento empresarial, lo que dificulta el conocimiento real de sus ganancias, de la administración de sus trabajos, del perfeccionamiento de sus productos y de las posibilidades de mejorar la entrea de los mismos.

En este punto, es importante situar la realidad:

La Fundación Cuesta Holguín (FCH), es una organización privada, sin fines de lucro. Creada según acuerdo No. 000709 del Ministerio de Bienestar Social, el 19 de Febrero de 1992, publicado en el Registro Oficial 109.

La FCH es el espacio elegido por los miembros de la Familia Cuesta Holguín, para canalizar *su compromiso de responsabilidad social por la comunidad.*

#### **MISION:**

Generamos bienestar y creamos oportunidades para el desarrollo comunitario en la provincia del Tungurahua.

#### **VISION:**

En el 2015 ser una organización sólida, auto sostenible, considerado referente en el ejercicio de la responsabilidad social, mediante la implementación de programas de desarrollo participativo de gran impacto que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas, en la provincia de Tungurahua.

## PROYECTOS IMPULSADOS AÑO 2013


- Ayudas Médicas
- Inserción socio laboral de personas con discapacidad
- Mantenimiento de la infraestructura de Escuelas y equipamiento con material didáctico.
- Donaciones

En este contexto la fundación ha centrado su ayuda a personas con discapacidad, y es espacial a otras fundaciones más pequeñas o que recién se encuentran iniciando su labor, de manera muy importante, en este contexto con el presente proyecto se pretende ofertar los lineamientos mas

La realidad socio-económica de la localidad motiva a los grupos menos favorecidos, dentro de los cuales se encuentran no solamente las personas, sino que también las familias de las personas con discapacidad, se busque formas de mejorar las condiciones de vida.

En tal virtud, es importante la generación correcta de recursos generando micro emprendimientos que muchas veces fracasan por la falta de apoyo en todos los ámbitos. De ahí que los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Contabilidad y Auditoría, de las Carreras de Economía e Ingeniería Financiera al detectar esta iniciativa económica van a aportar con su contingente de conocimiento para desarrollar el fortalecimiento de estos emprendimiento y otorgar los lineamientos necesarios para viabilizar los mismos.

## 2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA



## **b) Interpretación**

Hemos determinado que la problemática que se nos presenta en este momento, nos evidencia, que las fundaciones a las que se prestaran la asistencia, conocen el manejo de los recursos, pero de una manera empírica.

La falta de una estructura clara y definida de los procesos administrativos, productivos, financieros y humanos en ellas no permite un posicionamiento en el mercado que facilite el retorno de la inversión o que se generen utilidades significativas, pues estos recursos que se obtienen son de vital necesidad para la supervivencia de las mismas, en esto radica la necesidad de captar la mayor cantidad de recursos, para solventar las necesidades.

La falta de planificación en todas las áreas hace que los productos de las fundaciones sean desconocidos en el mercado lo que provoca un bajo volumen de ventas. Se desconocen las bondades del marketing lo que se percibe en la escasez de clientes y de nuevos mercados.

Los procesos productivos son empíricos y deben ser mejorados con prontitud si se desea alcanzar niveles de productividad que permitan generar ventajas competitivas sostenibles y rentables. Los costos de los procesos deben permitir ahorro de recursos, bajos niveles de desperdicios y otorgar satisfacción al cliente con la mejora de los mismos.

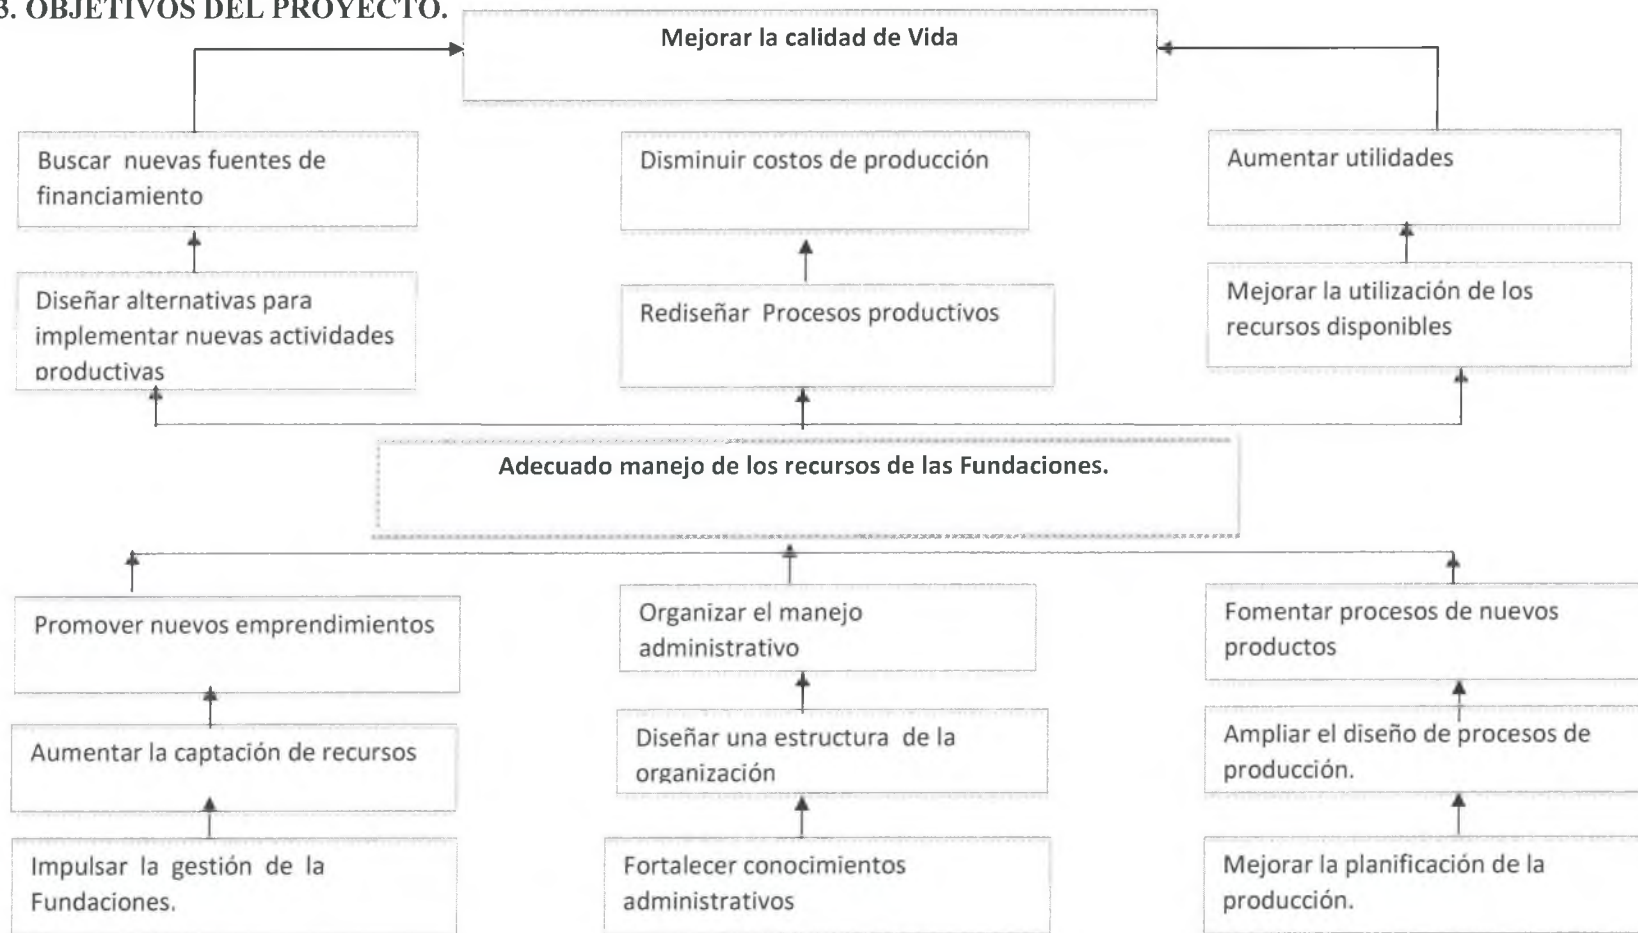
La participación activa de los miembros de las fundaciones en la ejecución de los procesos debe ser encausada a potenciar sus competencias para alcanzar eficiencia en todas y cada una de las actividades y áreas de las fundaciones a través de diferentes programas sobre todo de capacitación.

Es importante definir la estructura organizacional, diseñar los objetivos y estrategias que deben guiar el caminar de las fundaciones definiendo las funciones y responsabilidades de cada uno de los miembros, a pesar de que cuentan con una estructura, se ve necesario mejorar el enfoque.



<b>2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:</b>		
<b>SECTOR:</b> Áreas Genéricas y Complementarias	<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Asesoría	<b>INDICADORES:</b>  El 80% de los recursos que poseen las fundaciones son manejados inadecuadamente.  Un 70% de las actividades programadas no cuentan con financiamiento.  El 80% de los recursos que obtendrá la fundación serán canalizados para el apoyo a las personas.
<b>2.4. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):</b>		
<p>Las entidades beneficiarias serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fundación Cuesta Holguín</li> <li>✓ Fundación Manos Unidas de Tisaleo</li> <li>✓ Fundación San Juan Bautista de Mocha</li> <li>✓ Fundación Corazón de María de Pelileo</li> </ul>		

### 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.



**3.1 OBJETIVO GENERAL:**

Establecer un adecuado manejo de los recursos para el fortalecimiento económico y financiero de las fundaciones mejorando la calidad de vida de sus miembros.

**3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- Incrementar el financiamiento de las fundaciones.
- Manejar de forma adecuada los recursos de la fundaciones
- Aumentar niveles de productividad.

### 3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

<b>Resumen Narrativo de Objetivos</b>	<b>Indicadores Verificables Objetivamente</b>	<b>Fuentes de Verificación</b>	<b>Supuestos de sustentabilidad</b>
<b>FIN:</b> Mejorar la Calidad de Vida	<b>Indicadores del fin:</b> Aumentar el 5% de ganancias obtenidas por ventas en el segundo semestre del 2013.	<b>Medios del fin:</b> Presentación de Estados financieros	<b>Supuestos del fin:</b> Productos diversificados
<b>PROPÓSITO:</b> Adecuado manejo de los recursos de las Fundaciones.	<b>Indicadores del Propósito:</b> Aumentar la productividad en un 10% en el segundo semestre del 2013	<b>Medios del propósito:</b> Presentación de informes del Área de producción y ventas.	<b>Supuestos del propósito:</b> Auditorías externas

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p><b>COMPONENTES:</b></p> <p>1. Incrementar el financiamiento</p> <p>2. Manejar de forma adecuada los recursos de la fundaciones</p> <p>3. Aumentar niveles de productividad</p>	<p><b>Indicadores de Componentes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborar un proyecto de financiamiento y obtención de recursos.</li> <li>• Realizar mensualmente la supervisión de los manejos de los recursos en el periodo 2013</li> <li>• Incrementar el nivel de ventas en un 5% en el segundo semestre del 2013</li> </ul>	<p><b>Medios de Componentes:</b></p> <p>Presentación de proyectos de inversión a las ONG e instituciones financieras.</p> <p>Presentación de informes de producción que verifiquen el manejo de los recursos de la fundaciones</p> <p>Registro de pedidos e informe de ventas</p>	<p><b>Supuestos de Componentes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoyo de entidades gubernamentales</li> <li>• Elaboración de un informe en el que se marque el alcance de los objetivos.</li> <li>• Aceptación del producto en el mercado potencial.</li> </ul>

<b>COMPONENTES, ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES:</b>	<b>Presupuesto: \$ 1250</b>	<b>Medios de actividades:</b>	<b>Supuestos de actividades:</b>
<p><b>1. Incrementar el financiamiento</b></p> <p>1.1 Aumentar la captación de recursos</p> <p>1.1.1 Ampliar el segmento del mercado</p> <p>1.1.2 Diversificar productos</p> <p>1.2 Impulsar la gestión de la Fundaciones.</p> <p>1.3 Promover nuevos emprendimientos.</p> <p>1.3.1 Capacitar en las áreas de proyectos de emprendimiento.</p> <p>1.3.2 Impulsar concursos de proyectos de emprendimiento.</p>		<p>Documentos para los trámites</p>	<p>Reuniones con las instituciones financieras y ONGs periódicas o de acuerdo al proceso de las gestiones</p> <p>Interés de los capacitadores en conocimientos actuales</p>

<p><b>2. Manejar de forma adecuada los recursos de la fundaciones</b></p> <p><b>2.1. Organizar el manejo administrativo</b></p> <p><b>2.1.1. Tecnificar las actividades administrativas</b></p> <p><b>2.1.2. Definir el liderazgo.</b></p> <p><b>2.2 Diseñar una estructura de la organización</b></p> <p><b>2.2.1 Realizar un organigrama estructural y funcional.</b></p> <p><b>2.2.2. Determinar funciones y actividades</b></p> <p><b>2.3 Fortalecer conocimientos administrativos</b></p> <p><b>2.3.1 Capacitar en el área administrativa</b></p> <p><b>2.3.2 Evaluar de forma continua el proceso administrativo.</b></p>			<p>Confiabledad por parte de instituciones de financiamiento ONGs.</p>
---	--	--	--

<p><b>3. Aumentar niveles de productividad.</b></p> <p><b>3.1</b> Mejorar el diseño de procesos de producción.</p> <p><b>3.1.1</b> Diseñar flujos de procesos.</p> <p><b>3.1.2</b> Analizar la capacidad instalada</p> <p><b>3.2</b> Mejorar la planificación de producción.</p> <p><b>3.2.1</b> Determinar la capacidad de producción.</p> <p><b>3.2.2</b> Capacitar al talento humano en el proceso productivo.</p> <p><b>3.3</b> Fomentar procesos productivos eficientes.</p> <p><b>3.3.1</b> Optimizar recursos</p> <p><b>3.3.2</b> Determinar los tiempos y movimientos de producción.</p>			
--	--	--	--




#### 4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

4.1 CRONOGRAMA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES						
COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	Y	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
		DESDE	HASTA	# HORAS		
<b>Componente 1: Incrementar el financiamiento</b>		17 Oct.	20 Oct-2013	26	Econ. Mg. Francisco Mosquera Estudiantes	Económicos Materiales Humanos
<b>Actividad 1.1</b> Aumentar la captación de recursos <b>Subactividad 1.1.1</b> Ampliar el segmento del mercado <b>Subactividad 1.1.2</b> Diversificar productos		17 Oct.	20 Oct-2013	8	Econ. Mg. Francisco Mosquera Estudiantes	Económicos Materiales Humanos
<b>Actividad 1.2</b> Impulsar la gestión de la Fundaciones. <b>Subactividad 1.2.1</b> Buscar donaciones de instituciones públicas y ONGS. <b>Subactividad 1.2.2</b> Autogestionar en personas particulares.		24 Oct.	27 Oct.-2013	10	Econ. Mg. Francisco Mosquera Estudiantes	Económicos Materiales Humanos
<b>Actividad 1.3</b> Promover emprendimientos locales. <b>Subactividad 1.3.1</b> Capacitar en las áreas de proyectos de emprendimiento. <b>Subactividad 1.3.2</b> Impulsar concursos de proyectos de emprendimiento.		01 Nov.	04 Nov-2013	8	Econ. Mg. Francisco Mosquera Estudiantes	Económicos Materiales Humanos
<b>Componente 2: Manejar de forma adecuada los recursos de la fundaciones</b>		08 Nov.	11 Nov-2013	44	Econ. Mg. Francisco Mosquera Estudiantes	Económicos Materiales Humanos

<b>Actividad 2.1.</b> Organizar el manejo administrativo <b>Subactividad 2.1.1</b> Tecnicificar las actividades administrativas <b>Subactividad 2.1.2</b> Definir el liderazgo.	15 Nov.	18 Nov - 2013	16	Econ. Mg. Francisco Mosquera Estudiantes	Económicos Materiales Humanos
<b>Actividad 2.2</b> Diseñar una estructura de la organización <b>Subactividad 2.2.1</b> Realizar un organigrama estructural y funcional. <b>Subactividad 2.2.2.</b> Determinar funciones y actividades	22 Nov.	25 Nov - 2013	12	Econ. Mg. Francisco Mosquera Estudiantes	Económicos Materiales Humanos
<b>Actividad 2.3</b> Fortalecer conocimientos administrativos <b>Subactividad 2.3.1</b> Capacitar en el área administrativa	29 Nov.	3 Dic.-2013	16	Econ. Mg. Francisco Mosquera Estudiantes	Económicos Materiales Humanos
<b>Componente 3: Aumentar niveles de productividad.</b>	5 Dic.	8 Dic.-2013	34	Econ. Mg. Francisco Mosquera Estudiantes	Económicos Materiales Humanos
<b>Actividad 3.1</b> Mejorar el diseño de procesos de producción. <b>Subactividad 3.1.1</b> Diseñar flujos de procesos. <b>Subactividad 3.1.2</b> Analizar la capacidad instalada	12 Dicc.	15 Dic - 2013	8	Econ. Mg. Francisco Mosquera Estudiantes	Económicos Materiales Humanos
<b>Actividad 3.2</b> Mejorar la planificación de producción. <b>Subactividad 3.2.1</b> Determinar la capacidad de producción. <b>Subactividad 3.2.2</b> Capacitar al talento humano en el proceso productivo.	19 Dic.	22 Dic - 2013	16	Econ. Mg. Francisco Mosquera Estudiantes	Económicos Materiales Humanos
<b>Actividad 3.3</b> Fomentar procesos productivos eficientes. <b>Subactividad 3.3.1</b> Optimizar recursos <b>Subactividad 3.3.2</b> Determinar los tiempos y movimientos de producción.	26 Dic.	29 Dic - 2013	10	Econ. Mg. Francisco Mosquera Estudiantes	Económicos Materiales Humanos

<p>(F) <del>FB/BN</del></p> <p><b>Econ. Mg. Francisco Mosquera S.</b></p> <p><b>DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</b></p> <p>(F) <del>Pablo d. Cuevas</del></p> <p><b>Ing. Pablo Cuevas</b></p> <p><b>COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</b></p>	1.	1.
	Econ. Mg. Francisco Mosquera S.	Grupo 1
		2.
		Grupo 2
		3.
		Grupo 3

**5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO**


<b>5.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO – FINANCIADO POR LA U.T.A.</b>					
<b>DOCENTES AUTORES Y PARTICIPAN TES</b>	<b>HORAS SEMANALE S ASIGNADA S EN EL DISTRIBUT IVO DE TRABAJO DOCENTE PARA PROYECTO S DE VINCULACI ÓN CON LA SOCIEDAD</b>	<b>Nº DE SEMANAS LABORABL ES: CICLO ACADÉMIC O (Indicar período) Ejemplo: septiembre 2013-febrero 2014</b>	<b>TOTAL HORAS CICLO ACADÉMI CO (Horas semanales *# de semanas)</b>	<b>COST O HOR AS USD</b>	<b>COSTO HORAS PROYECT O (USD) (TOTAL HORAS CICLO ACADÉMI CO * COSTO HORA)</b>
Francisco Mosquera S.	5	20	100	12,50	1250
<b>TOTAL DEL PROYECTO (USD)</b>					
<p>F. </p> <p><b>Econ. Mg. Francisco Mosquera S.</b></p> <p><b>DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</b></p>					

## A. INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERAS DE: INGENIERÍA FINANCIERA Y ECONOMIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

PROYECTO: Fortalecimiento económico y financiero de fundaciones de atención a personas con discapacidad y el desarrollo de nuevos productos y nuevos mercados <b>CÓDIGO: FCAUD-IF-E-001-SEPTIEMBRE 2013 – FEBRERO 2014</b>										
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)			TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO				
1. FUNDACION CUESTA HOLGUIN			DESDE	HASTA	# HORAS	TOTAL: 1250 USD				
NÚMERO DE BENEFICIARIOS:			17 Oct.	29 Dic.	80					
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES					
NOMBRE	CARGO	DOCENTE(S)	HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DISTRIBUTIVO DOCENTE	HOMBRES			# HORAS PLANIFICADAS	MUJERES	# HORAS PLANIFICADAS	
1. Ing. Pablo Cuevas P.	1. Director Ejecutivo	Econ Mg Francisco Mosquera S.	100 horas	Salinas	Arroba	Jorge	80	Cruz León	Adriana Estefanía	80
				López	Paredes	Gonzalo Efrain	80	Freire Silva	Teresa Azucena	80
				Castro	Viteri	Christian Andrés	80	Frías Gordón	Andrea Elizabeth	80
				Fuentes	Garcés	Diego Alejandro	80	Gavilanes	Toapanta Martha Rebeca	80
				Paredes	Andino	Javier Marcelo	80	Naranjo	Sulca Cristina Elizabeth	80
								Peña Solís	Gabriela Del Rocío	80
								Taipe Vilva	Maria Belen	80
								Tiche Baltazar	Luz Maria	80
								Espin	Barahona Jessica Alexandra	80
								Mantilla	Rodríguez Estefanía Elizabeth	80
				Montesdeoca	Haro	80				

						Ana Isabel	
						Pilatuña Gualaceo Jenny Daniela	80
						Solis Solis Verónica Elizabeth	80
						Tubón Palate Liliana Alexandra	80
						Viera Guerrero Jenny del Pilar	80
						Jerez Panimboza Silvana Elizabeth	80
						Orellana Vargas Grace Johana	80
						Vargas Coello Tamara Jazmín	80
						Lescano Chiquito Paulina Alexandra	RETIRADA
						Robayo Durán Verónica Lizbeth	80
						Zamora Avila Ibeth Nataly	80
PRESENTADO POR:		REVISADO POR:		INFORME FAVORABLE			
 Econ. Mg. Francisco Mosquera S. DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		 Econ. Rosario Vasconez COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD		 Ing. Victor Guachinboza DIRECTOR CENECITA			

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
“CEVIC”**

**FACULTAD DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA**



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad

**CARRERAS DE:** “ECONOMÍA E INGENIERÍA FINANCIERA”

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “Fortalecimiento económico y financiero de fundaciones de atención a personas con discapacidad y el desarrollo de nuevos productos y nuevos mercados.”

**DOCENTE COORDINADOR:** Econ. Mg. Francisco Mosquera S.

**DOCENTE AUTOR:** Econ. Mg. Francisco Mosquera S.

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** Fundación Cuesta Holguín

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA:** Ing. Pablo Cuevas P.

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** “FCAUD-IF-E-001-SEPTIEMBRE 2013 – FEBRERO 2014”

Ambato, Septiembre 2013

## ÍNDICE ETAPA II




### CONTENIDO

	<b>Pág.</b>
Carátula	1
Índice	2
1. Estrategias de Monitoreo.	3
2. Resumen de Asistencia de los estudiantes participantes.	5
3. Registro de Actividades Tutoriales del Coordinador y Docentes Participantes del Proyecto.	10

















## 1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO \$ 1250.00	TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO \$1250.00
	DESDE	HASTA	# HORAS		DESDE	HASTA	# HORAS	
<b>Componente 1: Incrementar el financiamiento</b>								
<b>Actividad 1.1</b> Aumentar la captación de recursos	17 – oct	20 – oct.	8		17 oct	20 oct.	8	
<b>Subactividad 1.1.1</b> Ampliar el segmento del mercado	17 – oct	20 – oct.	4		17 oct	20 oct.	4	
<b>Subactividad 1.1.2</b> Diversificar productos	17 – oct	20 – oct.	4		17 oct	20 oct.	4	
<b>Actividad 1.2</b> Impulsar la gestión de la Fundaciones.	24 – oct	27 – oct.	10		24 oct	27 oct.	10	
<b>Subactividad 1.2.1</b> Buscar donaciones de instituciones públicas y ONGS.	24 – oct	27 – oct.	5		24 oct	27 oct.	5	
<b>Subactividad 1.2.2</b> Autogestionar en personas particulares.	24 – oct	27 – oct.	5		24 oct	27 oct.	5	
<b>Actividad 1.3</b> Promover emprendimientos locales.	01 Nov.	04 Nov.	8		01 Nov.	04 Nov.	8	
<b>Subactividad 1.3.1</b> Capacitar en las áreas de proyectos de emprendimiento.	01 Nov.	04 Nov.	4		01 Nov.	04 Nov.	4	
<b>Subactividad 1.3.2</b> Impulsar concursos de proyectos de emprendimiento.	01 Nov.	04 Nov.	4		01 Nov.	04 Nov.	4	
<b>Componente 2: Manejar de forma adecuada los recursos de la fundaciones</b>								
<b>Actividad 2.1</b> Organizar el manejo administrativo	08 Nov.	11 Nov.	16		08 Nov.	11 Nov.	16	
<b>Subactividad 2.1.1</b> Tecnificar las actividades administrativas	08 Nov.	11 Nov.	8		08 Nov.	11 Nov.	8	
<b>Subactividad 2.1.2</b> Definir el liderazgo.	08 Nov.	11 Nov.	8		08 Nov.	11 Nov.	8	
<b>Actividad 2.2</b> Diseñar una estructura de la organización	15 Nov.	18 Nov.	12		15 Nov.	18 Nov.	12	
<b>Subactividad 2.2.1</b> Realizar un organigrama estructural y funcional.	15 Nov.	18 Nov.	6		15 Nov.	18 Nov.	6	
<b>Subactividad 2.2.2</b> Determinar funciones y actividades	22 Nov.	25 Nov.	6		22 Nov.	25 Nov.	6	
<b>Actividad 2.3</b> Fortalecer conocimientos administrativos	29 Nov.	3 Dic.	16		29 Nov.	3 Dic.	16	
<b>Subactividad 2.3.1</b> Capacitar en el área administrativa	29 Nov.	3 Dic.	16		29 Nov.	3 Dic.	16	
<b>Componente 3: Aumentar niveles de productividad.</b>								




<b>Actividad 3.1</b> Mejorar el diseño de procesos de producción.	5 Dic.	8 Dic.	8		5 Dic.	8 Dic.	8	
<b>Subactividad 3.1.1</b> Diseñar flujos de procesos	5 Dic.	8 Dic.	4		5 Dic.	8 Dic.	4	
<b>Subactividad 3.1.2</b> Analizar la capacidad instalada	5 Dic.	8 Dic.	4		5 Dic.	8 Dic.	4	
<b>Actividad 3.2</b> Mejorar la planificación de producción.	12 Dic.	19 Dic.	16		12 Dic.	19 Dic.	16	
<b>Subactividad 3.2.1</b> Determinar la capacidad de producción.	12 Dic.	19 Dic.	8		12 Dic.	19 Dic.	8	
<b>Subactividad 3.2.2</b> Capacitar al talento humano en el proceso productivo.	12 Dic.	19 Dic.	8		12 Dic.	19 Dic.	8	
<b>Actividad 3.3</b> Fomentar procesos productivos eficientes.	19 Dic.	29 Dic.	10		19 Dic.	29 Dic.	10	
<b>Subactividad 3.1.1</b> Optimizar recursos	19 Dic.	29 Dic.	5		19 Dic.	29 Dic.	5	
<b>Subactividad 3.1.2</b> Determinar los tiempos y movimientos de producción.	19 Dic.	29 Dic.	5		19 Dic.	29 Dic.	5	
<b>TOTAL</b>								
F:  Econ. Mg. Francisco Mosquera S. DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO			F:  Ing. Pablo Cuevas P. COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA			F:  Econ. Rosario Vasquez COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA UNIVERSIDAD DE LA COLECTIVIDAD		

2. RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Nº	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	Nº DE CÉDULA	12/10/2013	17/10/2013	19/10/2013	23/10/2013	25/10/2013	30/10/2013	01/11/2013	09/11/2013	06/11/2013	08/11/2013	13/11/2013	15/11/2013	16/11/2013	20/11/2013	22/11/2013	23/11/2013	27/11/2013	29/11/2013	30/11/2013	04/12/2013	06/12/2013	07/12/2013	11/12/2013	13/12/2013	14/12/2013	18/12/2013	21/12/2013	26/12/2013	28/12/2013	29/12/2013	TOTAL DE HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE	FIRMAS ESTUDIANTES
1	Cruz León Adriana Estefanía	1804375630	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	82	
2	Freire Silva Teresa Azucena	1804643870	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	82	
3	Frias Gordón Andrea Elizabeth	1804895298	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	82	
4	Gavilanes Toapanta Martha Rebeca	1804468062	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	82	
5	Naranjo Sulca Cristina Elizabeth	1804969630	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	82	
6	Peña Solis Gabriela del Roeto	1803770856	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	82	

7	Salinas Arroba Jorge Mauricio	1804552626	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	82	
8	Taípe Silva María Belén	0503725608	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	82	
9	Tiche Baltazar Luz María	1804963674	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	82	
10	Espín Barahona Jessica Alexandra	1804459327	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	4	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	83	
11	Mantilla Rodríguez Estefanía Elizabeth	1804464996	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	4	3	2	3	3	2	3	3	2	3	6	83	
12	Montesdeoca Haro Ana Isabel	1803644614	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	4	3	2	3	3	2	3	3	2	3	6	83	
13	López Paredes Gonzalo Efraín	1804142865	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	4	3	2	3	3	2	3	3	2	3	6	83	
14	Pilatuña Gualaceo Jenny Daniela	1600502643	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	4	3	2	3	3	2	3	3	2	3	6	83	

15	Solis Solis Verónica Elizabeth	1803876703	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	4	3	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	6	83	
16	Tubón Palate Liliana Alexandra	1803977956	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	4	3	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	6	83	
17	Viera Guerrero Jenny del Pilar	1804125936	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	4	3	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	6	83	
18	Zamora Avila Ibeth Nataly	1804693883	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	4	4	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	81	
19	Jerez Panimboza Silvana Elizabeth	1804978193	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	4	4	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	81	
20	Orellana Vargas Grace Johana	1600613077	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	4	4	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	81	
21	Castro Viteri Christian Andrés	1500799042	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	4	4	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	81	
22	Paredes Andino Javier Marcelo	1803995982	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	4	4	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	81	










23	Robayo Durán Verónica Lizbeth	1600506610	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	4	4	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	81	
24	Fuentes Garcés Diego Alejandro	1804136032	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	4	4	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	81	
25	Vargas Coello Tamara Jazmín	1803813508	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	4	4	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	81	



Econ. Mg. Francisco Mosquera S.  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO







**1. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO**

**COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:**  
**Fortalecimiento económico y financiero de fundaciones de atención a personas con discapacidad y el desarrollo de nuevos productos y nuevos mercados Econ. Mg. Francisco Mosquera S.**

FECHA/ DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE
2-sep	17H00	22H00	5	Planificación de las actividades	
9-sep	17H00	22H00	5	Planificación de las actividades	
16-sep	17H00	22H00	5	Planificación de las actividades	
23-sep	17H00	22H00	5	Planificación de las actividades	
30-sep	17H00	22H00	5	Planificación de las actividades	
16-oct	8H00	11H00	3	Asistencia a las fundaciones, coordinación de actividades estudiantiles	
23-oct	8H00	11H00	3	Asistencia a las fundaciones, coordinación de actividades estudiantiles	
30-oct	8H00	11H00	3	Asistencia a las fundaciones, coordinación de actividades estudiantiles	
06-nov	8H00	11H00	3	Asistencia a las fundaciones, coordinación de actividades estudiantiles	


13-nov	8H00	11H00	3	Asistencia a las fundaciones, coordinación de actividades estudiantiles	<del>FB 2 B 80</del>
20-nov	8H00	11H00	3	Asistencia a las fundaciones, coordinación de actividades estudiantiles	<del>FB 2 B 80</del>
27-nov	8H00	11H00	3	Asistencia a las fundaciones, coordinación de actividades estudiantiles	<del>FB 2 B 80</del>
04-dic	8H00	11H00	3	Asistencia a las fundaciones, coordinación de actividades estudiantiles	<del>FB 2 B 80</del>
11-dic	8H00	11H00	3	Asistencia a las fundaciones, coordinación de actividades estudiantiles	<del>FB 2 B 80</del>
18-dic	8H00	11H00	3	Asistencia a las fundaciones, coordinación de actividades estudiantiles	<del>FB 2 B 80</del>
12-oct	8H00	13H00	5	Planificación de las actividades	<del>FB 2 B 80</del>
19-oct	8H00	13H00	5	Planificación de las actividades	<del>FB 2 B 80</del>
26-oct	8H00	13H00	5	Planificación de las actividades	<del>FB 2 B 80</del>
02-nov	8H00	13H00	5	Planificación de las actividades	<del>FB 2 B 80</del>
09-nov	8H00	13H00	5	Planificación de las actividades	<del>FB 2 B 80</del>
16-nov	8H00	13H00	5	Planificación de las actividades	<del>FB 2 B 80</del>
23-nov	8H00	13H00	5	Planificación de las actividades	<del>FB 2 B 80</del>



30-nov	8H00	13H00	5	Planificación de las actividades	
07-dic	8H00	13H00	5	Planificación de las actividades	
14-dic	8H00	13H00	5	Planificación de las actividades	
21-dic	8H00	13H00	5	Planificación de las actividades	
28-dic	8H00	13H00	5	Planificación de las actividades	
28-dic	8H00	13H00	5	Planificación de las actividades	

F: 

Econ. Mg. Francisco Mosquera S.  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

F: 

Ing. Pablo Cuevas P.  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
“CEVIC”**

**FACULTAD DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA**



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad

**CARRERAS DE:** “ECONOMÍA E INGENIERÍA FINANCIERA”

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPA III: “EVALUACIÓN”**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “Fortalecimiento económico y financiero de fundaciones de atención a personas con discapacidad y el desarrollo de nuevos productos y nuevos mercados.”

**DOCENTE COORDINADOR:** Econ. Mg. Francisco Mosquera S.

**DOCENTE AUTOR:** Econ. Mg. Francisco Mosquera S.

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** Fundación Cuesta Holguín

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA:** Ing. Pablo Cuevas P.

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** “FCAUD-IF-E-001-SEPTIEMBRE 2013 – FEBRERO 2014”

Ambato, Septiembre 2013

## ÍNDICE ETAPA III

<b>CONTENIDO</b>	<b>Pág.</b>
Carátula	1
Índice	2
1. Informe Final	3
2. Evaluación de Resultados.	7
3. Fichas de Evaluación.	9
4. Resumen de Beneficiarios.	11
4.1 Matriz de Enfoque de Igualdad.	
4.2 Matriz de Enfoque Territorial	
5. Certificado de Entidad Beneficiaria	13
6. Producto (s) del Proyecto	14
7. Anexos	15

## 1. INFORME FINAL

### 1.1. Resumen Ejecutivo

La planificación, evaluación y ejecución del presente proyecto se enmarcó dentro del buen vivir proclamado en la constitución, desde este punto los estudiantes tuvieron la oportunidad de interactuar con personas con discapacidad, que salen del mundo en el que ellos se desarrollan.

Durante la ejecución del presente proyecto los estudiantes tuvieron la oportunidad de desarrollar sus habilidades como monitores de estas personas de uno de los sectores vulnerables de la sociedad, además el cariño demostrado por ellos en la gratitud que han tenido.

Desarrollaron competencias de su carrera al transferir sus conocimientos a las personas de las fundaciones en las que se desarrollaron las diferentes actividades.



## 1.2. Antecedentes

La Fundación Cuesta Holguín se ha dedicado a dar el apoyo a personas con discapacidad, esta fundación se ha dedicado como actividad fundamental a la inserción dentro de empresas de nuestra localidad a estas personas.

Dentro de este marco por intermedio de esta fundación se consiguió trabajar con tres fundaciones que cada una tiene sus diferentes actividades, estas fundaciones se encuentran ubicadas en los cantones de Mocha, Tisaleo y Pelileo, que trabajan directamente con grupos vulnerables.

Fundación San Juan Bautista de Mocha, se dedica al trabajo con niños, jóvenes y adultos mayores, los dos primeros grupos con discapacidad de tipo intelectual, desarrollan productos en fomix, en fieltro.

Fundación Manos Unidas de Tisaleo, trabaja con niños y jóvenes con discapacidad intelectual, síndrome de Down, que desarrollan actividades como diseño de tarjetas para fechas específicas (Navidad), velas recicladas.

Fundación Corazón de María de Pelileo, esta fundación atiende a niños con discapacidad intelectual, síndrome de Down, desarrollan actividades en fomix, alambre.

Es importante indicar que el nivel de discapacidad es bajo, que está comprobado que las personas pueden realizar trabajos manuales repetitivos.



### 1.3. Actividades realizadas

Dentro de las actividades desarrolladas se detallan a continuación:

Capacitación en todo lo referente a la correcta administración de las entidades, donde se desarrollaron temas como:

- ✓ Motivacionales de cómo ser un padre de una persona con discapacidad (Liderazgo)
- ✓ Realidad nacional
- ✓ Marketing
- ✓ Posicionamiento de productos
- ✓ Desarrollo de nuevos productos.

Se desarrollo la Planificación estratégica para la Fundación Manos Unidas, para mejorar el desempeño de la misma.

Se realizo la apertura de mercado, en este caso se busco un nuevo mercado en la ciudad de Latacunga, donde se logro duplicar la venta de los productos navideños elaborados por cada una de las fundaciones, se logro establecer ventas y pedidos para la elaboración de velas decorativas, adornos navideños y sobre todo el pedido de productos para otras fechas.

El concretar los mercados abiertos es una labor fuerte para las diferentes fundaciones, este trabajo para que rinda frutos depende de ellos, los contactos fueron realizados, y se tuvo éxito en la venta realizada el 18 de diciembre en la ciudad de Latacunga, donde se vendió lo que se esperaba, con una mejora en los precios.



#### 1.4. Resultados e Impactos

Dentro del desarrollo del presente proyecto dentro del área comercial se logró:

- ✓ El desarrollo de nuevos productos
- ✓ Apertura de mercados para fechas tradicionales como son: Día del amor y la amistad, día de la madre, día del padre, día de los difuntos, navidad, fechas que no fueron consideradas y que cumplirán con dos metas, la primera es la de generar recursos y la realización de actividades de desarrollo motriz de los miembros de las fundaciones.

Elaboración y fortalecimiento del plan estratégico de las diferentes fundaciones:

- ✓ Revisión y fortalecimiento de la planificación estratégica de las fundaciones de Mocha y Pelileo, ambas fundaciones cuentan con este instrumento, lo que en este caso se realizó es la socialización de la misma a los miembros administrativos de las fundaciones.
- ✓ Elaboración de la Planificación estratégica de la fundación de Tisaleo, con la debida socialización.

Soporte técnico en áreas financieras.

- ✓ Con la ayuda de las estudiantes se colaboró con el cálculo de los costos y precios de venta para reducir las pérdidas y optimizar los recursos económicos de las diferentes fundaciones



## 2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
<b>FIN:</b> Mejorar la Calidad de Vida	Aumentar el 5% de ganancias obtenidas por ventas en el segundo semestre del 2013.	Se logró el incremento de las ventas en la época navideña logrando que el valor de los productos en muchos de los casos se duplique y se amplíe la demanda y que no sea únicamente en la Provincia de Tungurahua, sino también en la Provincia de Cotopaxi, específicamente en la ciudad de Latacunga	90 %
<b>PROPOSITO:</b> Adecuado manejo de los recursos de las Fundaciones.	Aumentar la productividad en un 10% en el segundo semestre del 2013	Se consiguió aumentar la productividad de las fundaciones, mediante la correcta aprovecharían de los recursos y materiales que ellos poseen así como del mejor manejo de las donaciones que reciben por parte de personas que se han comprometido a apoyarles.	100 %
<b>COMPONENTE 1:</b> Incrementar el financiamiento	Elaborar un proyecto de financiamiento y obtención de recursos.	Se han presentado propuestas a los organismos de turno, y se tramitara por parte del grupo de fundaciones ayudas externas para aumentar los recursos y mejorar la infraestructura.	90 %
<b>COMPONENTE 2:</b> Manejar de forma adecuada los recursos de la fundaciones	Realizar mensualmente la supervisión de los manejos de los recursos en el periodo 2013	Se realizó una revisión del manejo de los recursos al inicio del trabajo y se realizaron algunas sugerencias, para mejorar el manejo, y en el mes de enero se realizó otra revisión obteniendo mejores resultados, en cuanto a aprovechar, no solamente los recursos económicos, sino las diferentes donaciones.	100 %
<b>COMPONENTE 3:</b> Aumentar niveles de productividad	Incrementar el nivel de ventas en un 5% en el segundo semestre del 2013	Los niveles de productividad de las fundaciones fueron aumentados, en cuanto al nivel de ventas, específicamente en el mes de diciembre de los productos elaborados para la fecha.	100 %
<b>VALORACIÓN FINAL:</b> El proyecto se desarrolló dentro del marco de la colaboración mutua entre los estudiantes de la universidad y los miembros de las fundaciones donde existió un estricto compromiso para el correcto desarrollo del mismo			
<b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:</b>			
<b>Conclusiones:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Existió el mejoramiento en el nivel de productividad de las fundaciones, tomándose en cuenta que el trabajo de las mismas para captar recursos, en muchos de los casos es limitado y muy difícil. El planteamiento de nuevas estrategias de autogestión para mejorar el nivel de ingresos de las fundaciones para así mantener un flujo un poco más constante de ingresos y mejorar la calidad de vida de los miembros de la fundación.</li> </ul>			
<b>Recomendaciones:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mantener los contactos establecidos, para de esta manera mejorar el desempeño y la captación de recursos.</li> <li>✓ Mantener las sugerencias emitidas durante el trabajo de este proyecto.</li> </ul>			
 F: _____ <b>Econ. Mg. Francisco Mosquera S.</b> <b>DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</b>	 F: _____ <b>Ing. Pablo Cuevas P.</b> <b>COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</b>	 F: _____ <b>Econ. Rosario Vasquez</b> <b>COORDINADOR UNIDAD DE RINGULACIÓN CON LA</b> <b>COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD</b> <b>COLECTIVIDAD</b>	



### 3. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.

#### CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CARRERAS DE: INGENIERÍA FINANCIERA Y ECONOMÍA

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACIÓN CUESTA HOLGUÍN

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento económico y financiero de fundaciones de atención a personas con discapacidad y el desarrollo de nuevos productos y nuevos mercados.

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	Cruz León Adriana Estefanía	80	APRUEBA	14	Pilatuña Gualaceo Jenny Daniela	80	APRUEBA
2	Freire Silva Teresa Azucena	80	APRUEBA	15	Solís Solís Verónica Elizabeth	80	APRUEBA
3	Frías Gordón Andrea Elizabeth	80	APRUEBA	16	Tubón Palate Liliana Alexandra	80	APRUEBA
4	Gavilanes Toapanta Martha Rebeca	80	APRUEBA	17	Viera Guerrero Jenny del Pilar	80	APRUEBA
5	Naranjo Sulca Cristina Elizabeth	80	APRUEBA	18	Zamora Avila Ibeth Nataly	80	APRUEBA
6	Peña Solis Gabriela del Rocío	80	APRUEBA	19	Jerez Panimboza Silvana Elizabeth	80	APRUEBA
7	Salinas Arroba Jorge Mauricio	80	APRUEBA	20	Orellana Vargas Grace Johana	80	APRUEBA
8	Taipe Silva María Belén	80	APRUEBA	21	Castro Viteri Christian Andrés	80	APRUEBA
9	Tiche Baltazar Luz María	80	APRUEBA	22	Paredes Andino Javier Marcelo	80	APRUEBA
10	Espin Barahona Jessica Alexandra	80	APRUEBA	23	Robayo Durán Verónica Lizbeth	80	APRUEBA
11	Mantilla Rodríguez Estefanía Elizabeth	80	APRUEBA	24	Fuentes Garcés Diego Alejandro	80	APRUEBA
12	Montesdeoca Haro Ana Isabel	80	APRUEBA	25	Vargas Coello Tamara Jazmín	80	APRUEBA
13	López Paredes Gonzalo Efraín	80	APRUEBA	26			

F:

  
Econ. Mg. Francisco Mosquera S.

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

Ambato, 20 de Febrero del 2014

### 3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

#### 3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERAS DE: INGENIERÍA FINANCIERA Y ECONOMÍA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: "Fortalecimiento económico y financiero de fundaciones de atención a personas con discapacidad y el desarrollo de nuevos productos y nuevos mercados." "FCAUD-IF-E-001-SEPTIEMBRE 2013 – FEBRERO 2014"		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	74
	MUJER	86
	SUBTOTAL	160
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	58
	DE 15 A 29 AÑOS	69
	DE 30 A 64 AÑOS	28
	DE 65 Y MAS AÑOS	5
	SUBTOTAL	160
DISCAPACIDADES	FÍSICA	8
	PSICOLÓGICA	0
	MENTAL	101
	AUDITIVA	2
	VISUAL	0
	SUBTOTAL	111
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	0
	MESTIZOS	160
	BLANCOS	0
	AFROAMERICANOS	0
	MONTUBIOS	0
	OTROS	0
	SUBTOTAL	160
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL	0
	EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL	0
	ECUADOR	
	SUBTOTAL	0

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES

F. \_\_\_\_\_

Econ. Mg. Francisco Mosquera S.

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

### 3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERAS DE: INGENIERIA FINANCIERA Y ECONOMÍA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

<b>PROYECTO:</b> “Fortalecimiento económico y financiero de fundaciones de atención a personas con discapacidad y el desarrollo de nuevos productos y nuevos mercados.” “FCAUD-IF-E-001-SEPTIEMBRE 2013 – FEBRERO 2014”				
No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLIVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABI			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	MOCHA	MATRIZ	34
		PELILEO	HUAMBALÓ	60
		TISALEO	MATRIZ	66
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
<b>TOTAL</b>				

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES

F. \_\_\_\_\_




Econ. Mg. Francisco Mosquera S.  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

### C. INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORIA  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERAS DE: INGENIERÍA FINANCIERA Y ECONOMÍA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.

PROYECTO: Fortalecimiento económico y financiero de fundaciones de atención a personas con discapacidad y el desarrollo de nuevos productos y nuevos mercados. CÓDIGO: FCAUD-IF-E-001-SEPTIEMBRE 2013 – FEBRERO 2014							
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)		TIEMPO DE EJECUCIÓN			PRESUPUESTO EJECUTADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO USD (\$)		
1. Fundación Cuesta Holguín	2.	DESDE	HASTA	# HORAS			
NUMERO DE BENEFICIARIOS:		17 oct.	29 dic.	80	TOTAL: 1250 USD		
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO		ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	DOCENTE(S)	HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DISTRIBUTIVO DOCENTE	HOMBRES	# HORAS CUMPLIDAS	MUJERES	# HORAS CUMPLIDAS
1. Ing. Pablo Cuevas P.	1. Director Ejecutivo	Econ. Mg. Francisco Mosquera S.	5 horas	Salinas Arroba Jorge Mauricio	80	Cruz León Adriana Estefanía	80
				López Paredes Gonzalo Efraín	80	Freire Silva Teresa Azucena	80
				Castro Viteri Christian Andrés	80	Frias Gordón Andrea Elizabeth	80
				Fuentes Garcés Diego Alejandro	80	Gavilanes Toapanta Martha Rebeca	80
				Paredes Andino Javier Marcelo	80	Naranjo Sulca Cristina Elizabeth	80
						Peña Solis Gabriela Del Roció	80
						Taípe Vilva Maria Belen	80
						Tiche Baltazar Luz Maria	80
						Espín Barahona Jessica Alexandra	80
						Mantilla Rodriguez Estefanía Elizabeth	80
				Montesdeoca Haro	80		

					Ana Isabel	
					Pilatuña Gualaceo Jenny Daniela	80
					Solís Sofís Verónica Elizabeth	80
					Tubón Palate Liliana Alexandra	80
					Viera Guerrero Jenny del Pilar	80
					Jerez Panimboza Silvana Elizabeth	80
					Orellana Vargas Grace Johana	80
					Vargas Coello Tamara Jazmín	80
					Lescano Chiquito Paulina Alexandra	RETIRADA
					Robayo Durán Verónica Lizbeth	80
					Zamora Avila Ibeth Nataly	80
PRESENTADO POR:		REVISADO POR:		INFORME RESPONSABLE:		
 Econ. Mg. Francisco Mosquera S. DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		 Econ. Rosario Vasconez COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA		 Ing. Victoria Panimboza DIRECTORA CENTEUTA		

## CERTIFICADO


El Suscrito Ing. Pablo Cuevas P. de la Fundación Cuesta Holguín en debida forma y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, Carreras de Ingeniería Financiera y Economía, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad “Fortalecimiento económico y financiero de fundaciones de atención a personas con discapacidad y el desarrollo de nuevos productos y nuevos mercados.”; con una duración total de 80 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto 160 integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que de al presente el uso que a bien tuviera .

Lugar, 20 de febrero de 2014

f.   
Ing. Pablo Cuevas P.  
Director Ejecutivo
